



**Majestic Engineering Co Ltd**

**定安工程有限公司**

*A Member of FSE Lifestyle*



**Young's Engineering Co Ltd**

**景福工程有限公司**


*A Member of FSE Lifestyle*

# **Ceiling Works Working Permit** **工作許可證(送電後「天花」工作)**

**Revised on 28-08-2023**

打左電,又要在上天花高位施工

點搞 ???



## Key Point of Working Ceiling Permit

Ceiling works including installation, alternation or repair works inside ceiling void, disregarding whether false ceiling is provided but excluding short term works for testing/ commissioning and inspections(the “Ceiling Works”).

天花板工程包括天花上方空間的安裝、改造或維修工程，無論是否有假天花板，都納入天花工作許可證，但不包括用於測試和檢查的短期工程（“天花板工程”）。

## Key Point of Working Ceiling Permit

此工作許可證制度僅適用於在已通電的天花上的工程（不論天花是否設有假天花板）

This working permit system is only applicable for works to be carried out at ceiling where power has been partially switched on (disregarding the ceiling covered with false ceiling or not).

## Key Point of Working Ceiling Permit

天花工程可由不同分包商進行，不限於機電分包商，包括由KTSP / Hip Hing直接管理的分包商

The ceiling works may be proceeded by different sub-contractors not limited to E&M sub-contractors but also covers sub-contractors directly managed by KTSP or Hip Hing.

## Key Point of Working Ceiling Permit

申請人須在天花板工程開始前7天提出申請。

An Applicant is required to apply 7 days in advance to Ceiling Works commencement

## Key Point of Working Ceiling Permit

“電力區域”地圖將向所有申請人提供顯示不同電力區域劃分和負責發證人，供他們在申請許可證上標記，以識別擬關閉電力的電力區域。

“Power Zone” maps showing demarcations of different power zones and the responsible Issuers will be supplied to all Applicants for them to mark on the Permit for application identifying power zones intended switching off power.

施工位置提供各區 Power Zone申請停止電源供應。  
Power Zone圖給MEC & YEC各行頭工程師。



MEC EL Engineer



MEC EL Engineer




MEC EL Engineer



MEC EL Engineer



# Power Zone Map

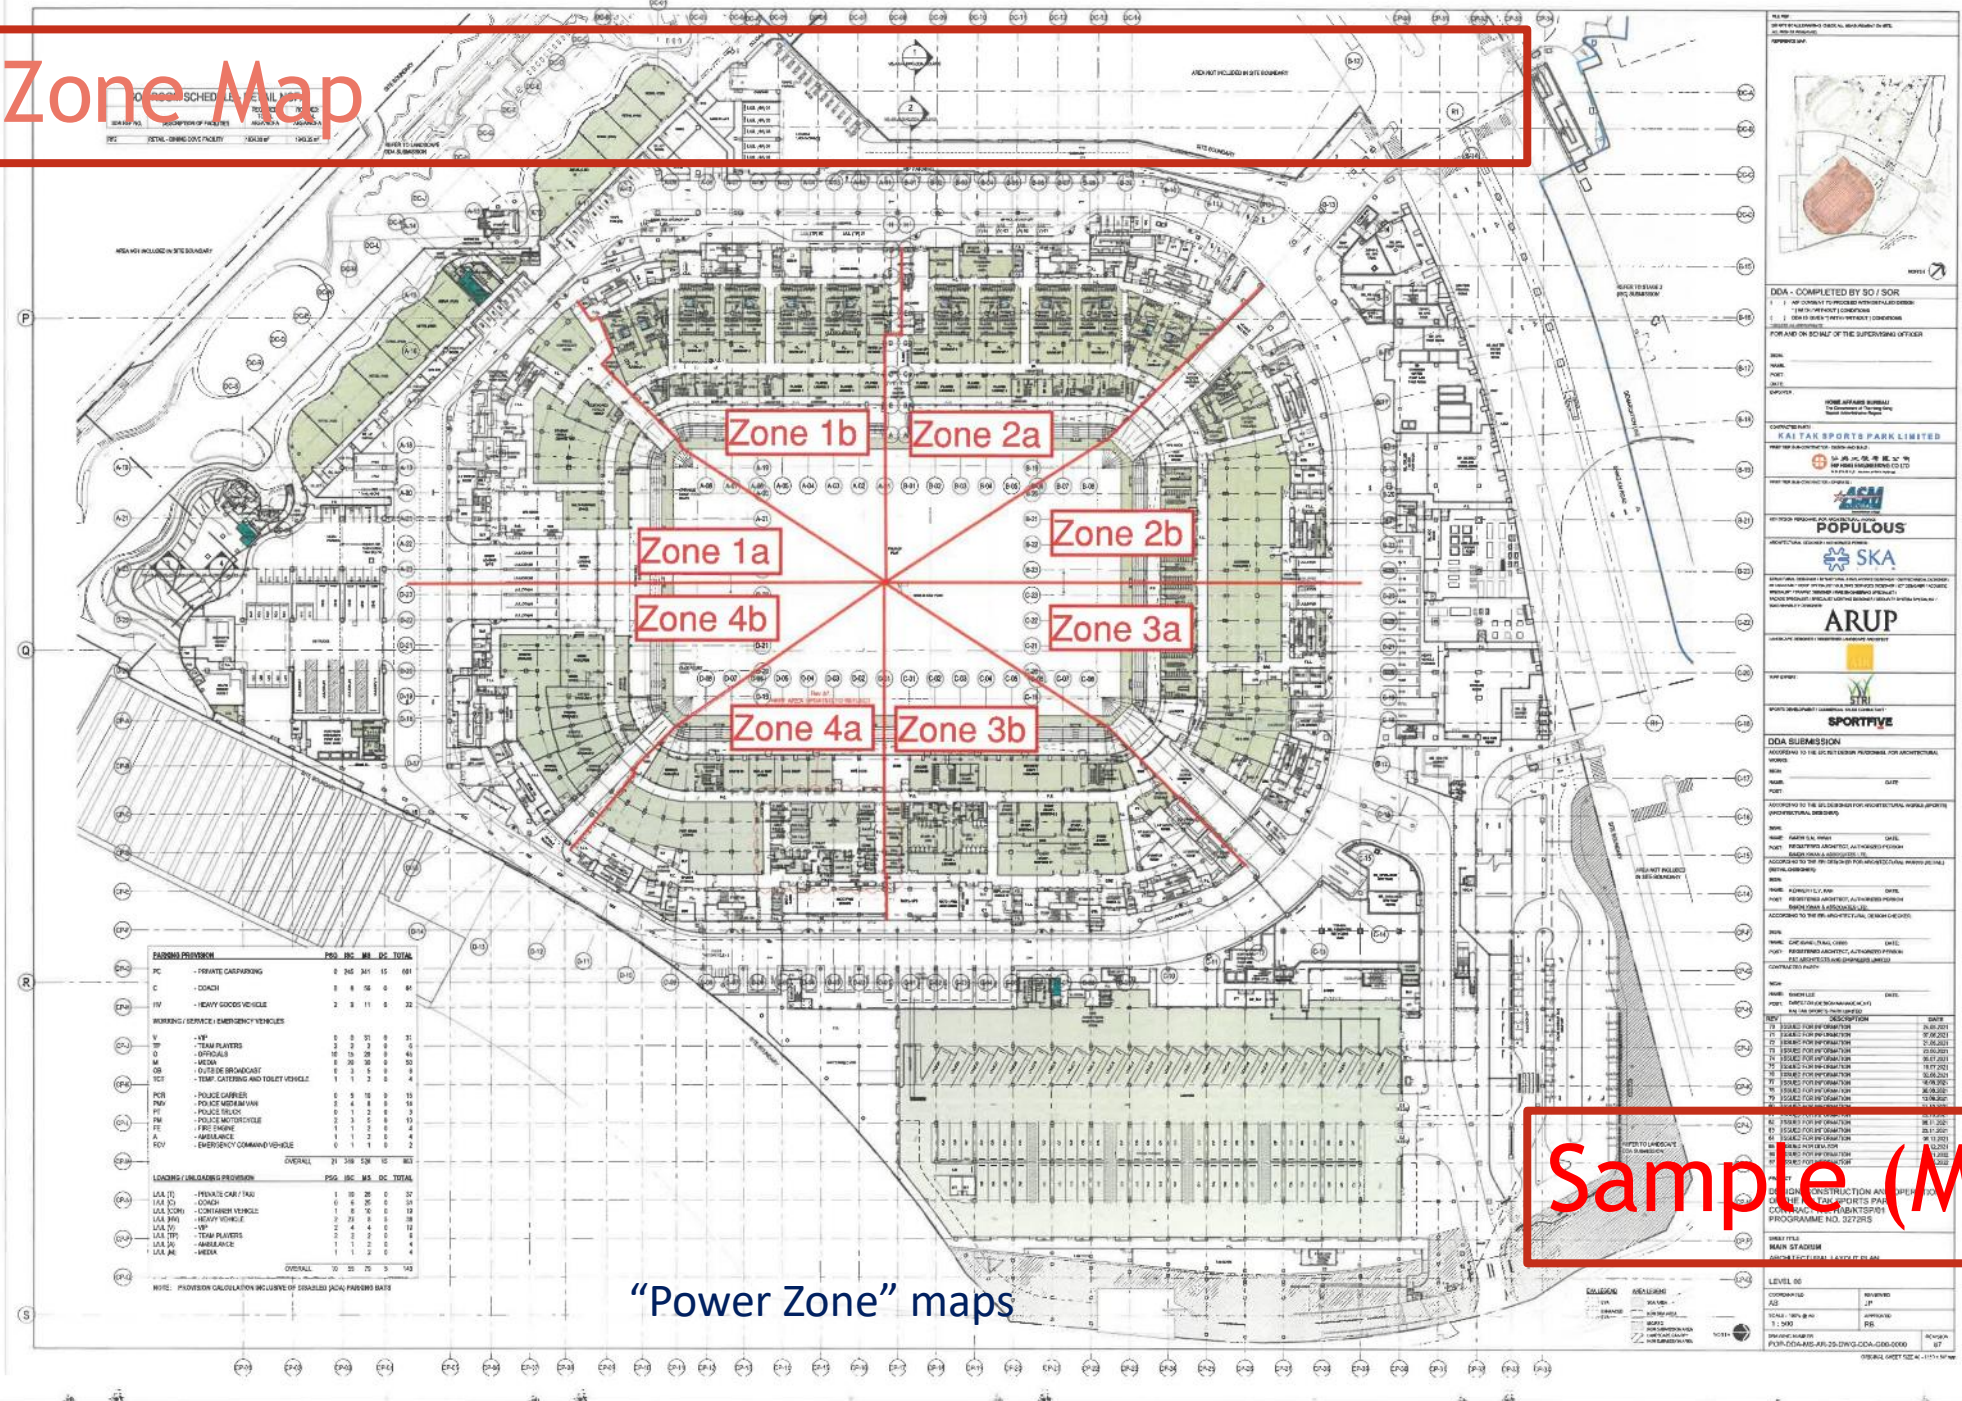


“Power Zone” maps

Sample (MS)



# Power Zone Map

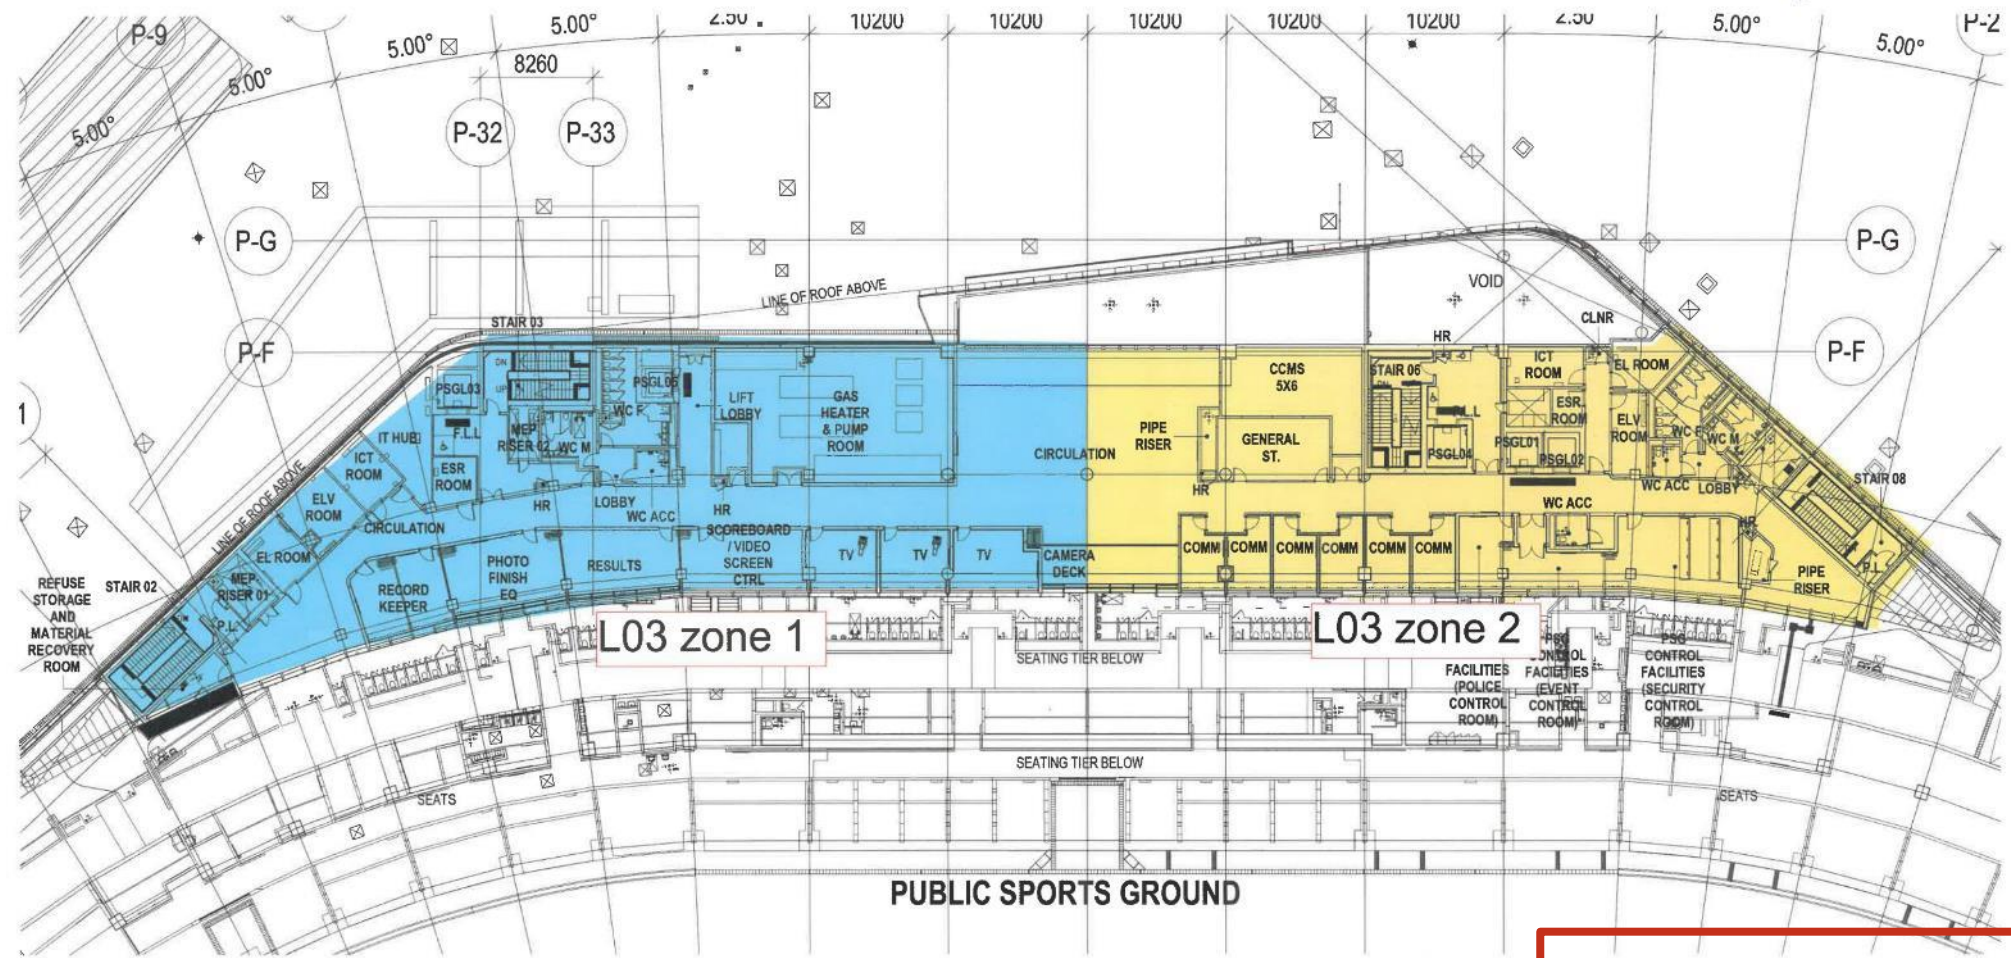


PSG Power Zone

Sample (PSG)

“Power Zone” maps



# Power Zone Map

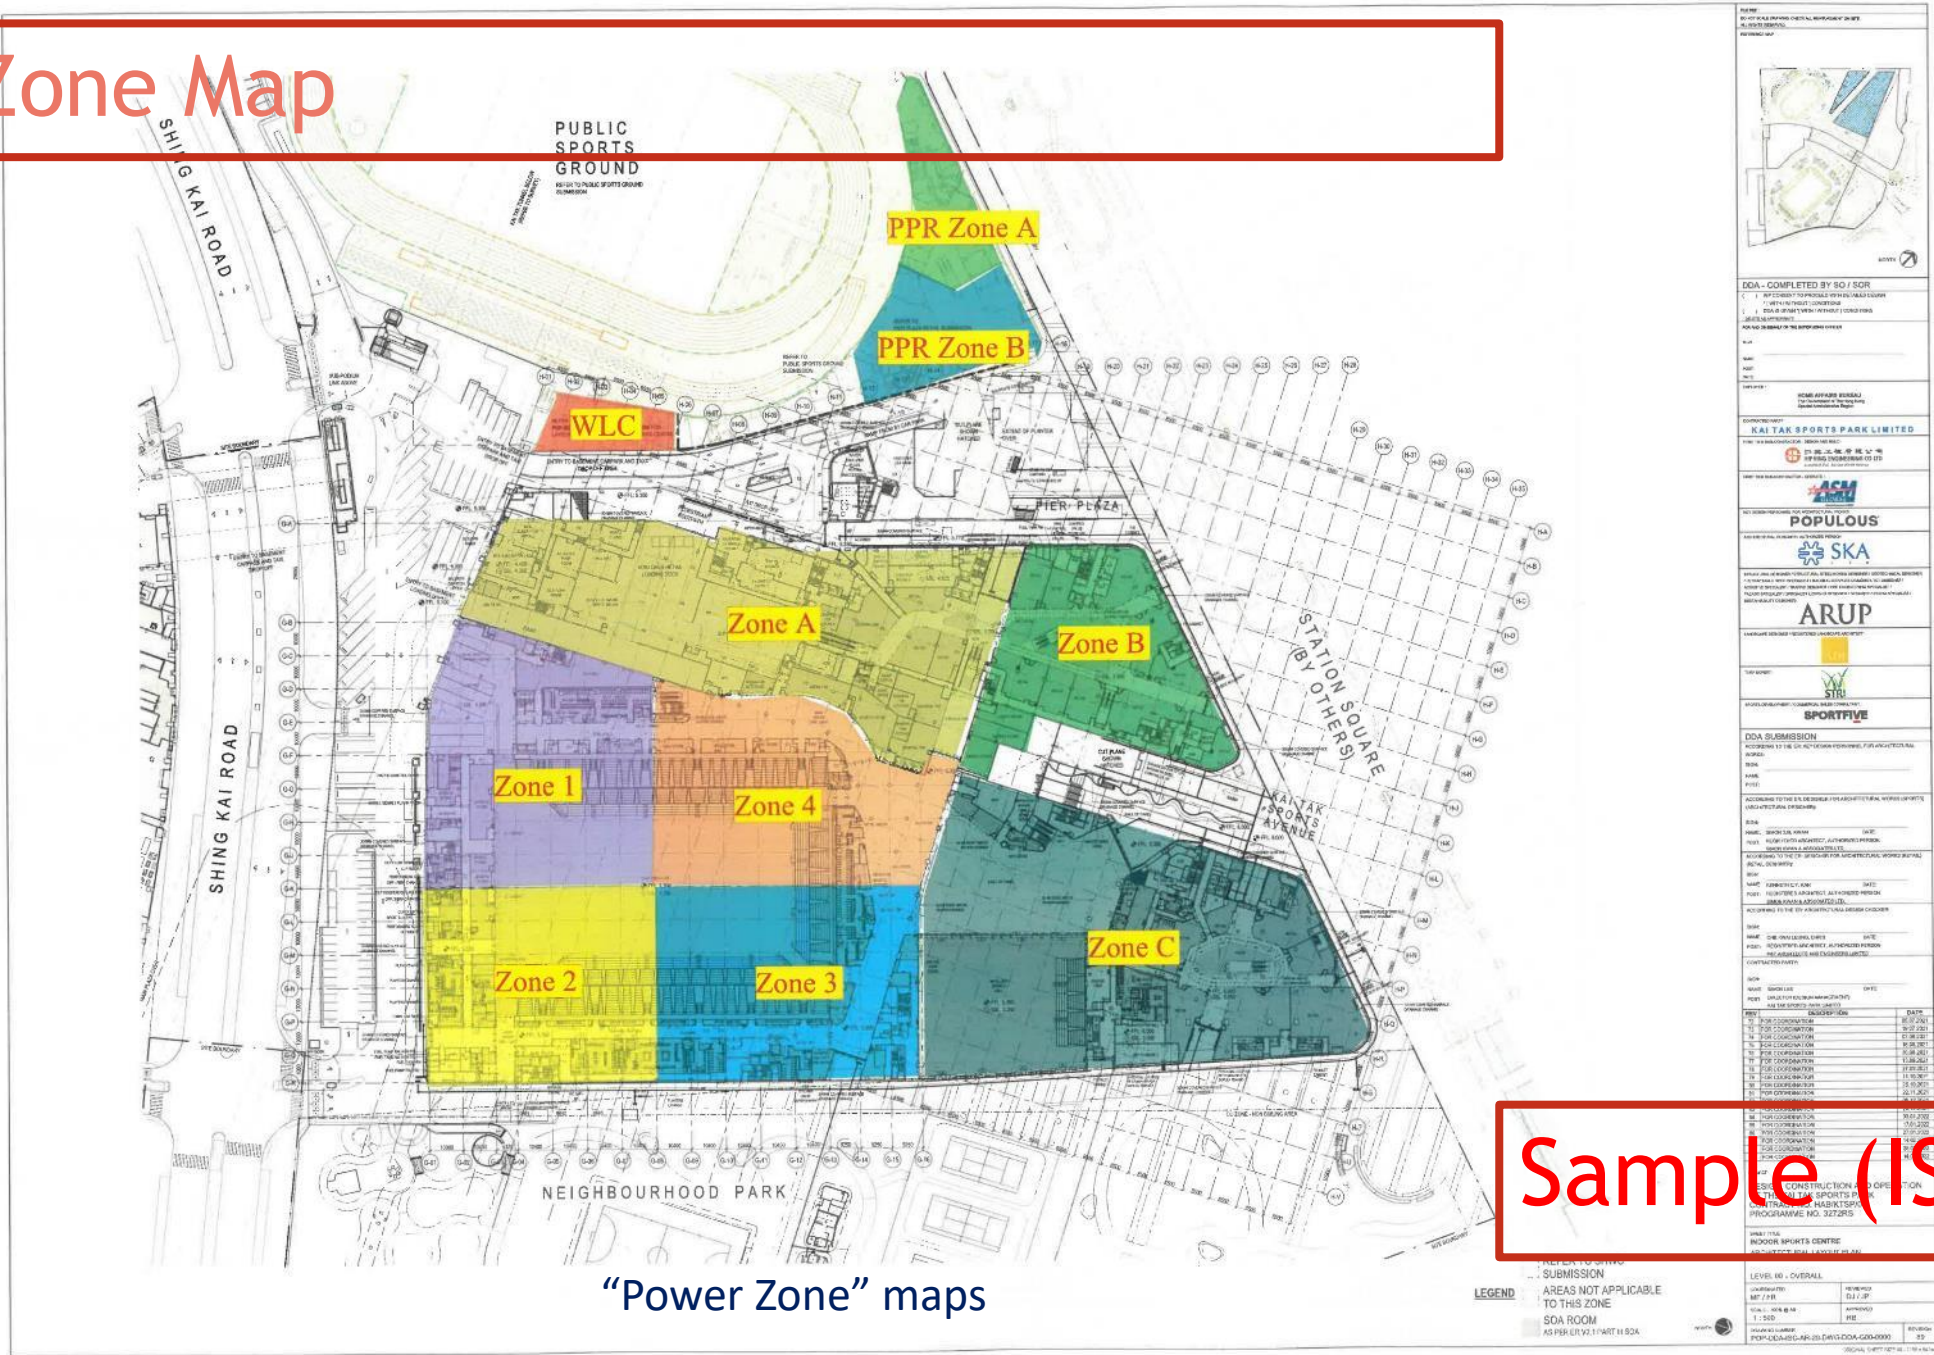

“Power Zone” maps

Sample (ISC)

## Key Point of Working Ceiling Permit

每一送電後天花工作許可證的有效期是一星期 (7日)

One Permit will be issued maximum for one week for one special area in the absence of power

## Key Point of Working Ceiling Permit

每日許可證的有效期為工作許可證上註明的期限內的 09:00 至 18:00。如果工程延長天數或需要夜間加班，工程師必須申請延期當前許可證以涵蓋延長的工程。

Daily validity of a ceiling working starts from 09:00 to 18:00 within the period marked on the working permit. If works are overrun for additional days or required working overtime at night, the Trade Engineer who originally submitted the application of working permit is required to apply for extension of the current permit to cover the extended works.

# Responsibility of Issuer, Applicant, Site Manager, Frontliner Supervisor

- 1) Briefing
- 2) Responsibility
- 3) .....
- 4) .....



## Permit to Work (Ceiling Works after energization) Application Form 天花許可證表格

Total : 5 pages

Page 1: Apply for Ceiling Work (申請於天花上施工(辦公時間內))

Page 2: Apply for Ceiling Work (for extension) (申請延長工作許可證 / 超時工作)

Page 3: Completion of Ceiling Work 撤銷工作許可證

Page 4 and 5 : Check List (附件)



# Permit to Work (Ceiling Works after energization) Application Form    天花許可證表格

## Page 1: Apply for Ceiling Work (申請於天花上施工(辦公時間內))

Form filled and Collected by the following parties

E&M	Responsible Person	Builder	Responsible Person
Fill in the Ceiling Permit to Work	Engineer of EL, MVAC , PD, FS and ICT (Majestic or Young's)	Fill in the Ceiling Permit to Work	Representative assigned by Builder
Endorse collective applications of a Permit and deliver to Electrical Issuers	Site Manager (Majestic or Young's)	2) Endorse collective applications of a Permit and deliver to Electrical Issuers	Site Manager (Majestic or Young's)



Page 2: Apply for Ceiling Work (for extension) (申請延長工作許可證 / 超時工作)

Form filled and Collected by the following parties

E&M	Responsible Person	Builder	
Fill in the Ceiling Permit to Work	Engineer of EL, MVAC , PD, FS and ICT (Majestic or Young's)	Fill in the Ceiling Permit to Work	Representative assigned by Builder
Endorse collective applications of a Permit and deliver to Electrical Issuers	Site Manager (Majestic or Young's)	Endorse collective applications of a Permit and deliver to Electrical Issuers	Site Manager (Majestic or Young's)

Permit to Work (Ceiling Works after energization) Application Form    天花許可證表格

Page 3: Apply for Completion of Ceiling Work (撤銷工作許可證)

Form filled and Collected by the following parties

E&M	Responsible Person	Builder	Responsible Person
Fill in the Completion of Ceiling Work and pass to Site Manager	Engineer of EL, MVAC , PD, FS and ICT (Majestic or Young's)	Fill in the Completion of Ceiling Work and pass to Site Manager	Representative assigned by Builder
Endorse collective applications of a Permit and deliver to Electrical Issuers	Site Manager (Majestic or Young's)	Endorse collective applications of a Permit and deliver to Electrical Issuers	Site Manager (Majestic or Young's)

# Permit to Work (Ceiling Works after energization) Application Form

# 天花許可證表格

## Page 4 to 5: Safety Checklist (撤銷工作許可證)

Form filled and Collected by the following parties

E&M	Responsible Person	Builder	
Check and complete the safety checklist	1) Fill in the checklist - Applicant of EL, MVAC , PD, FS and ICT subcontractors (Majestic or Young's) 2) Signed by supervisors of Subcontractors	Check and complete the safety checklist	1) Fill in the checklist - Applicant of Builder's Subcontractors 2) Signed by supervisors of Subcontractors
Endorse collective applications of a Permit and deliver to Site Manager	Engineer (Majestic or Young's)	2) Endorse collective applications of a Permit and deliver to Site Manager	Representative assigned by Builder

# Example: A FS subcon fill the check List

## 例子：消防分判申請天花工作

工作許可證(送電後「天花」工作)  
Permit to Work (Ceiling Works after energization)

許可證編號: MS/ISC/PSG/POS

「天花」工作許可證附件

有關工作團隊的資料:		
「申請人」姓名:	行業:	施工地點:
分判商名稱:		工作:
施工人員名單:		
(分判現場監督人員)		
姓名:	職位:	聯絡電話:
姓名:	職位:	聯絡電話:
(分判其他工人)		
姓名:	姓名:	
姓名:	姓名:	
姓名:	姓名:	
姓名:	姓名:	

註:若在正式開工時,上述工作人員有任何變動,分判商應立即通知申請入及區域安全主任,而現場監督人員亦應重新根據以下檢查表,對代替人員的安全要求再作審查

「天花」工作施工前檢查表		
(工人資歷和個人防護裝備)		
1. 分判委派施工的工人有否接受分判安全代表提供之以下訓練?		
a. 由供應商提供使用流動升降台之安全訓練	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無
b. 一般高空/離地工作訓練	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無
c. 指定高空工作訓練	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無
d. 使用「測電筆」訓練	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無
e. 觸電搶救訓練	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無
2. 分判有否委派施工的工人提供以下防護設備:		
a. 「雙尾式」安全帶	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無
b. 「頭燈」	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無
c. 充電式「小太陽」或臨時射燈	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無
d. 給現場監督人員提供絕緣手套等防護裝備,作搶救觸電之用。	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無

1. 分判商工頭填寫工作許可證之附件內容包括檢查項目及簽名確認。

2. 完成後,把附件遞交區域安全主任檢查附件內容及確認



消防分判商工頭



區域安全主任

# A FS subcon fill the check List

## 附件主要內容

- 1) 分判現場監督人員名單
- 2) 分判其他工人名單
- 3) 「天花」工作前檢查表
  - a) 工人已接受的訓練
  - b) 工人的個人防護裝備
  - c) 高空工作
  - d) 其他觸電風險



- 4) 確認：現場監督人員及安全人員

Majestic Engineering Co Ltd  
定安工程有限公司  
A Member of PS&S Group
Young's Engineering Co Ltd  
景福工程有限公司  
A Member of PS&S Group
表格號: EM-CWP-01

工作許可證(送電後「天花」工作)  
 Permit to Work (Ceiling Works after energization)

許可證編號: MS/HS/PSG/PSG -C0007-FS  
 預算工作日期: 28-03-2023 至 03-04-2023

「天花」工作許可證附件		
有關工作團隊的資料:		
「申請人」姓名: 袁錦文	行業: 消防	施工地點: L00-03(Z1&2)
分判商名稱: 偉聯	工作: 安裝花灑工程, 消防設備, 跟進消	
施工人員名單:		
(分判現場監督人員)		
姓名: 郭祖怡	職位: Engineer(電)	聯絡電話: 6273 7515
姓名: 歐樂笙	職位: Site Supervisor(水)	聯絡電話: 9554 7147
(分判其他工人)		
姓名: 林耀發	姓名: 廖文堅	
姓名: 林國柱	姓名: 松炬榮	
姓名: 江祥維	姓名: 崔嘉豪	
姓名: 歐樂笙	姓名: 蘇志傑	

註: 若在正式開工時, 上述工作人員有任何變動, 分判商應立即通知申請入及區域安全主任, 而現場監督人員亦應重新根據以下檢查表, 對代替人員的安全要求再作審查

「天花」工作前檢查表		
(工人資歷和個人防護裝備)		
1. 分別委派施工的工人有否接受分判安全代表提供之以下訓練?		
a. 由供應商提供使用流動升降台之安全訓練	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無
b. 一般高空/ 離地工作訓練	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無
c. 指定高空工作訓練	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無
d. 使用「測電筆」訓練	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無
e. 觸電搶救訓練	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無
2. 分別有否委派施工的工人提供以下防護設備:		
a. 「雙層式」安全帶	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無
b. 「頭燈」	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無
c. 充電式「小太陽」或臨時照明	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無
d. 現場監督人員提供絕緣手套等防護裝備, 作搶救觸電之用。	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無

Majestic Engineering Co Ltd  
定安工程有限公司  
A Member of PS&S Group
Young's Engineering Co Ltd  
景福工程有限公司  
A Member of PS&S Group
表格號: EM-CWP-01

工作許可證(送電後「天花」工作) 預算工作日期: 28-03-2023 至 03-04-2023  
 Permit to Work (Ceiling Works after energization)

許可證編號: PSG-C0007-AC-4

(高空工作)		
1. 使用流動升降台/ 流動金屬工作平台/ EVI31 梯台/ (請劃除不適用部分)		
2. 上述工具是否已作檢測及填寫法定表格?	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 不適用
3. 工人在上/ 落工作平台時, 會否有機會並非雙手緊抓平台樓梯「扶手」? 如果有, 如何防止工人在上/ 落時失足跌倒?	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無
4. 是否有機會跨越工作平台的圍欄進行操作? 如果是, 請在下欄填寫有關安全措施	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無
(其他觸電風險)		
1. 會否有打裂或鑽孔工序要進行? 如果有, 請跟進下一條。	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無
2. 有否與機械人研究, 有無觸電風險?	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無
3. 如在打裂或鑽孔工序有觸電風險, 請提供預防方案: N/A		

本人確認上述施工安排

盧凱亮

現場監督人員(姓名及簽名)

本人確認上述施工安排

盧凱亮

現場監督人員(姓名及簽名)

本人確認上述施工安排

區域安全主任(姓名及簽名)

本人確認上述施工安排

區域安全主任(姓名及簽名)





FORM 5  
表格五

[Reg. 51]  
[條例第 51 條]

**Factories and Industrial Undertakings (Lifting Appliances and Lifting Gear) Regulations**  
**LIFTING APPLIANCES**  
**CERTIFICATE OF RESULTS OF THOROUGH**  
**EXAMINATIONS IN THE PRECEDING TWELVE MONTHS**  
*Form approved by the Commissioner for Labour for the purposes of section 51(1) of the Factories and Industrial Undertakings (Lifting Appliances and Lifting Gear) Regulations*

**工廠及工業經營(起重機械及起重裝置)規例第 51 條的牌照格式**  
**起重機械在過往十二個月內進行的徹底檢驗結果證明書**  
本表格乃由勞工處核准供工廠及工業經營(起重機械及起重裝置)規例第 51 條的牌照格式

Description of appliance, e.g. type, identification marks, maximum safe working load, etc. 起重設備的描述，例如：種類、標記、額定載重、最高安全操作負荷等	Date of examination 檢驗日期	Result of examination 檢驗結果 (If any entry "Mark" and state whether in safe working order. 檢驗結果，註明所屬類別的標記或否屬安全，請填「是」字樣，否則填「否」字樣，以顯示該起重設備的安全狀況)
(1)	(2)	(3)

I hereby certify that the appliance(s) described in this certificate was/were thoroughly searched by me on ..... and that the above particulars are correct and true to the best of my knowledge and belief. 茲此證明本證明書內所載的起重設備，已按最高標準徹底檢查過。

Signature of Registered Professional Engineer  
註冊專業工程師簽署

Date of certificate  
簽發日期

Qualification  
專業資格

Signature  
簽署

Any signature or stamp or other mark on this certificate or on any report which is not a knowledgeable person in a technical jurisdiction shall be guilty of an offence under section 51(1) of the Factories and Industrial Undertakings Regulations. 任何公認的檢驗員或負責人，若其簽署人章或其他標記於此證明書或於任何報告，則屬犯法。詳情請參閱《工廠及工業經營條例》第 51 條。

LALG 15



# Example - A FS subcon submit the application to FS Engineer



消防分判商工頭



MEC FS Engineer

1. 分判商工頭把工作許可證-附件交給申請人(定安/景福工程師)

Majestic Engineering Co Ltd 定安工程有限公司  
Young's Engineering Co Ltd 景福工程有限公司  
A Member of IFC Group A Member of IFC Group  
表格號: EM-CWP-01

工作許可證(送電後「天花」工作)  
Permit to Work (Ceiling Works after energization)

許可證編號: MS/ISG/PSG/PQS -C0007-FS  
預算工作日期: 28-03-2023 至 03-04-2023

「天花」工作許可證附件

有關工作團隊的資料:

「申請人」姓名: 袁錦文	行業: 消防	施工地點: L00-03(Z1&2)
分判商名稱: 偉聯	工作: 安裝花灑工程, 消防設備, 跟進消防	
施工人員名單:		
(分判現場監督人員)		
姓名: 郭祖怡	職位: Engineer(電)	聯絡電話: 6273 7515
姓名: 歐樂笙	職位: Site Supervisor(水)	聯絡電話: 9554 7147
(分判其他工人)		
姓名: 林耀發	姓名: 廖文堅	
姓名: 林國柱	姓名: 林炬榮	
姓名: 江梓維	姓名: 崔嘉豪	
姓名: 歐樂笙	姓名: 蘇志偉	

註: 若在正式開工時, 上述工作人員有任何變動, 分判商應立即通知申請人及區域安全主任, 而現場監督人員亦應重新根據以下檢查表, 對代替人員的安全要求再作審查

「天花」工作施工前檢查表  
(工人資歷和個人防護裝備)

1. 分判委派施工的工人有否接受分判安全代表提供之以下訓練?		
a. 由供應商提供使用流動升降台之安全訓練	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無
b. 一般高空/ 離地工作訓練	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無
c. 指定高空工作訓練	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無
d. 使用「測電筆」訓練	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無
e. 觸電搶救訓練	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無
2. 分判有否委派施工的工人提供以下防護設備:		
a. 「雙尾式」安全帶	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無
b. 「頭燈」	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無
c. 充電式「小太陽」或臨時射燈	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無
d. 給現場監督人員提供絕緣手套等防護裝備, 作搶救觸電之用。	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無

## List of Engineer for application of Ceiling Work PTW at MS (E&M Trade)

Name	Position and Trade	Tel:
Rocky Kwong 鄺志榮	Site Manager	9751-1165
Andy Wong 黃錦泉	Site Manager	9653-1004
Lo Yat Fung Kelvin 羅逸峰	Project Engineer (Electrical)	6358-4211
Chan Wing Kit Ricky 陳永傑	Senior Engineer (PD)	6287-9525
Lui Pak Kin Addams 雷柏健	Senior Engineer (ICT)	9818-6618
Leung Hiu Wai Ray 梁曉偉	Sr Service Engineer (MVAC)	9345-7695
Li Ka Ho Leo 李家浩	Project Engineer (FS)	9859-9358



## List of Engineer for application of Ceiling Work PTW at ISC (E&M Trade)

Name	Position and Trade	Tel:
Jacky Wong 黃可榮	Site Manager	9456-0383
Joseph Chan 陳家俊 Vincent So 蘇偉新	Project Engineer Engineer (Electrical)	6676-0671 6970-9591
Wong Ngai Hang 王毅行 Chan Long Yu, June 陳朗瑜	Senior Engineer Senior Engineer (PD)	9466-5688 6352-9196
Raymond Man 文漢強 Law Ka Wing, Calvin 羅家榮	Senior Project Manager Supervisor (ICT)	6463-9916 9755-5866
Lam Tsz Ho 林子豪 Lam Tsz Chun 林子駿	Assistant Project Manager Senior Engineer (MVAC)	6841-2681 9229-4984
Leung Kam Cheong 梁錦昌	Engineer (FS)	6463-9835



MEC FS Engineer



Area Site Manager

## 2. 申請人填寫工作許可證第一部份 (姓名, 簽名, 停電Power Zone及檢查已附上附件檢查表)



Majestic Engineering Co Ltd  
定安工程有限公司  
A member of YTC Group



Young's Engineering Co Ltd  
景瀾工程有限公司  
A member of YTC Group

文件編號: ESO-CWP/01

工作許可證(通電後「天花」工作)

Permit to Work (Ceiling Works after energization)

許可證編號: MS/INCP/PSG/PIS

第一部份: 申請於天花上施工(辦公時間內)(由「申請人」填寫)

行業	申請人姓名	申請人簽名	Power Zone	Area	已檢查附件資料
電力					<input type="checkbox"/> 是
空調					<input type="checkbox"/> 是
水喉					<input type="checkbox"/> 是
消防					<input type="checkbox"/> 是
新電					<input type="checkbox"/> 是
建築					<input type="checkbox"/> 是

預算工作日期: 由 \_\_\_\_\_ 至 \_\_\_\_\_

註: (1) 每天工作時段為09:00至18:00

(2) 若工作時間超過18:00, 請重新填寫第二部分申請

審批:

工地經理(Site Manager)同意上述「天花」工作申請:

\_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

「發證人」批准上述「天花」工作申請:

\_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

「發證人」姓名及簽署(空行)

日期: \_\_\_\_\_

註: 統一停電時間為 \_\_\_\_\_ (由電氣「發證人」簽署)

附工前檢查及確認無電危害已解除

本人 \_\_\_\_\_ (姓名)(項目經理/工程師/監工)確認上述Power Zone已完成停電程序, 天花測試及確認天花無帶電。引擊或有關地掣已關閉及已執行上鎖掛牌的程序, 已去除觸電危害, 工作範圍安全。 簽署: \_\_\_\_\_

(日期: \_\_\_\_\_)

工地經理確認: \_\_\_\_\_ (姓名) 簽署: \_\_\_\_\_ (日期: \_\_\_\_\_)

\*合資格之電業工程人員

# Whatsapp Group for Ceiling PTW Communication

## Members of Whats Group

- 1) CSTB;
- 2) CE;
- 3) TSC;
- 4) Builder
- 5) E&M



Draft of Ceiling  
Permit



Area Site Manager

1. Site Manager把工作許可證第一部份, 停電Power Zone通知其他行頭(上載到whatsapp 群組)問有無需要在停電Power Zone工作



2. 其它行頭有需要時, 安排有關分判商填寫及附上附件檢查表。
3. 其它行頭的工程師填寫同一張申請工作許可證。
4. **兩日內完成**。  
(不接受之後的申請及臨時加入)



YNG AC Engineer



MEC ELV  
Engineer

11:06

Wi-Fi LTE1 74%

KTSP PSG 工作許可證 (文、進、Anson、Dennis、Elly、Engineer...

Michael Sit (Area Ma) 2023年2月8日

轉寄訊息



申請表格編號: APL/AR/...

Ceiling Permit (8-2-23).pdf  
5 頁 · 366 kB · PDF

17:56

Michael Sit (Area Manager)



申請表格編號: APL/AR/...

Ceiling Permit (20230213-19) FS.pdf  
5 頁 · 637 kB · PDF

19:28

@各行 現已收消防，雅舒曼(ICT)申請13-19号於L00-03天花以上工作申請，有額外承辦商須上天花工作，於星期五早上10:00或之前交齊相關資料，作進行審批

19:35

星期四

~ daven +852 9263 9949

Michael Sit (Area Manager)

@各行 現已收消防，雅舒曼(ICT)申請13-19号於L00-03天花以上工作申請，有額外承辦商須上天花工作，於星期...

訊息

# Approval of PTW / 批准天花工作許可證



**Area Site Manager**



**YNG AC Manager**

**MEC ELV Manager**

如有關施工位置,有行頭的電源會打出打入,需要加簽批准工作許可證



**MEC EL Manager**

批准工作許可證

# Area Site Manager 把工作許可證交電氣發証人



**Area Site Manager**

Majestic Engineering Co Ltd  
定安工程有限公司  
Young's Engineering Co Ltd  
原耀工程有限公司  
表格號: EM/CWP-01

工作許可證(通電後「天花」工作)  
Permit to Work (Ceiling Works after energization)

許可證編號: MS/HSE/PSG/POS--C0037

第一部份: 申請於天花上施工(辦公時間內)(由「申請人」填寫)

行業	申請人姓名	申請人簽名	Power Zone	Area	已檢查附件資料
電氣	Ken Tse	<i>[Signature]</i>	1, 2	L00	<input checked="" type="checkbox"/>
空調	Michael Lo	<i>[Signature]</i>	1, 2	L00	<input checked="" type="checkbox"/>
水喉	蘇勁輝	<i>[Signature]</i>	1, 2	L00	<input checked="" type="checkbox"/>
消防	袁錦文	<i>[Signature]</i>	1, 2	L00	<input checked="" type="checkbox"/>
弱電	John Ho	<i>[Signature]</i>	1, 2	L00	<input checked="" type="checkbox"/>
建築	劉偉強	<i>[Signature]</i>	1, 2	L00	<input checked="" type="checkbox"/>

預算工作日期: 由 01-08-2023 至 07-08-2023 \*\*只適用於后頁指示位置

註: (1) 每天工作時間為08:00至18:00  
(2) 每工作時間超過18:00, 每星期以若二部分申請

審批:

工地經理(Site Manager)同意上述「天花」工作安插:

SIT NGOR FOO *[Signature]* 31 July 2023  
 日期: 31 July 2023

「發証人」批准上述「天花」工作安插:

ALICE CHOW *[Signature]* 31 July 2023  
 日期: 31 July 2023

「發証人」姓名及簽署(電氣)

YIP HOP CHAU *[Signature]* 31 July 2023  
 日期: 31 July 2023

「發証人」姓名及簽署(空調)

註: 統一停電時間為 (由電氣「發証人」執署)


閉工前檢查及確認開電危害已消除

\*本人ALICE CHOW(姓名)(項目經理/工程師/監工)\*現確認上述Power Zone已完成停電程序、天花測試及確認天花無帶電; Δ1架及有關總掣已關閉及已執行上機掛牌的程序, 已去除開電的危害, 工作範圍安全。 簽署: \_\_\_\_\_  
 (日期: \_\_\_\_\_)

工地經理確認: SIT NGOR FOO(姓名) 簽署: \_\_\_\_\_ (日期: \_\_\_\_\_)

\*合資格的電業工程人員

# MEC EL發証人 安排統一停電時間 安排停電工作



**MEC EL發証人**



# 申請關閉電源表格

## Request for Temporary Power Suspension

KAI TAK  
SPORTS PARK  
啟德體育園

Permanent

### Request for Temporary Power Suspension

Project (工地名稱工程)	Kai Tak Sports Park	
Subcontractor(分包商) :	Majestic	
Reference No. (編號) :		
Date (日期) :	28/2/2023	
Subject (項目) :	Ceiling Lighting Suspension	
<b>Part A</b> To be completed by sub-contractor		
To :	Hip Hing	
From :	Majestic (Sub-contractor)	
Power Suspension Location :	L00~L03 (refer to attached)	
Power Suspension Required / Date / Time :		
Reason:	<input type="checkbox"/> Plastering <input type="checkbox"/> Painting <input type="checkbox"/> Maintenance <input type="checkbox"/> Temp Power Connection/Disconnection <input checked="" type="checkbox"/> Other Ceiling panel & MEP work installation	
Signature (Applicant Representative) :	Anakin Wong Date : 28/2/2023	
Contact no. (Applicant Representative) :	94464706	
<b>Part B</b> To be completed by Hip Hing and EL Sub-contractor		
Influenced Area:	L00-L03 ceiling (refer to attached)	
<input checked="" type="checkbox"/> Approval		
<input type="checkbox"/> Disapproval		
Reason:		
Signature :	Hip Hing - BS Manager Date: 28/3/23	
Signature :	Majestic (EL) - Project Manager Date: 28/3/23	
Remark : 1) Please allow at least three working days for checking and arrangement of power suspension.		
Power Suspension Date and Time:	28/3/2023 9:00 AM	
Majestic (EL) Representative / Engineer:	Anakin Wong	
<b>Part C</b> Power Resume		
<input type="checkbox"/> Site condition does comply with power energization requirement		
<input type="checkbox"/> Disapproval for power energization		
Reason:		
Signature :	Date: _____	
Person in Charge (REW)		
Signature :	Date: _____	
Hip Hing - BS Manager		
Signature :	Date: _____	
Majestic (EL) - Project Manager		





**許可證 Timeline**

# 上鎖掛牌 (許可證副本於旁邊展示)



Majestic Engineering Co Ltd 定安工程有限公司  
Young's Engineering Co Ltd 根福工程有限公司  
牌照號碼: EM-CWP-01

工作許可證(經更換「天花」工作)  
Permit to Work (Ceiling Works after energization)

許可證編號: MS4486/TS6/P88--C0041

第一部份: 申請於天花上施工(辦公時間內)(由「申請人」填寫)

行業	申請人姓名	申請人簽名	Power Zone	Area	已檢查材料資料
電氣	Ken Tse		1, 2	L00	✓/是
空調	Michael Lo		1, 2	L00	✓/是
水喉	嚴勁輝		1, 2	L00	✓/是
消防	袁錦文		1, 2	L00	✓/是
弱電	John Ho		1, 2	L00	✓/是
建築	劉偉雄		1, 2	L00	✓/是

預算工作日期: 由 07-08-2023 至 14-08-2023 \*\*只適用於后頁指示位置  
註: (1) 每天工作時間為08:00至18:00  
(2) 若工作時間超過18:00, 請與第二級申請

審批:

工地經理(Site MPTW (Ceiling) C0041(20230807-0814)-L00-  
SIT NGOR FOD [Signature] 7 Aug 2023  
日期:

「發證人」批准上述「天花」工作安排:  
ALICE CHOW [Signature] 7 Aug 2023  
日期:

「發證人」姓名及簽名(電話)  
YIP HOP CHAU [Signature] 7 Aug 2023  
日期:

「發證人」姓名及簽名(空調)  
註: 統一停電時間為 8:00pm (由電氣「發證人」批准)  
閉工前檢查及確認觸電危害已消除


\*本人ALICE CHOW(姓名)(項目經理/工程師/監工)\*現確認上述Power Zone已完成停電程序, 天花測試及確認天花無帶電, 凡擊及有關懸吊已關閉且已執行上鎖掛牌的程序, 已去除觸電的危險, 工作範圍安全, 簽署: [Signature]  
(日期: 5 Aug 2023)  
工地經理確認: SIT NGOR FOD(姓名) 簽署: [Signature] (日期: 8 Aug 2023)  
\*含字體的電業二級人員

## **Warning Notice for Ceiling Work Permit**

- 1) Warning Notice for Energized Ceiling Void Area**
- 2) Warning Notice for the Ceiling Work Permit Suspension Power Area**
- 3) Emergency Contact List and AED location**

## Warning Notice for Energized Ceiling Void Area

天花「已通電」危險告示  
(相關範圍開始及結束要有一個，其  
後每15米最少要有一個)

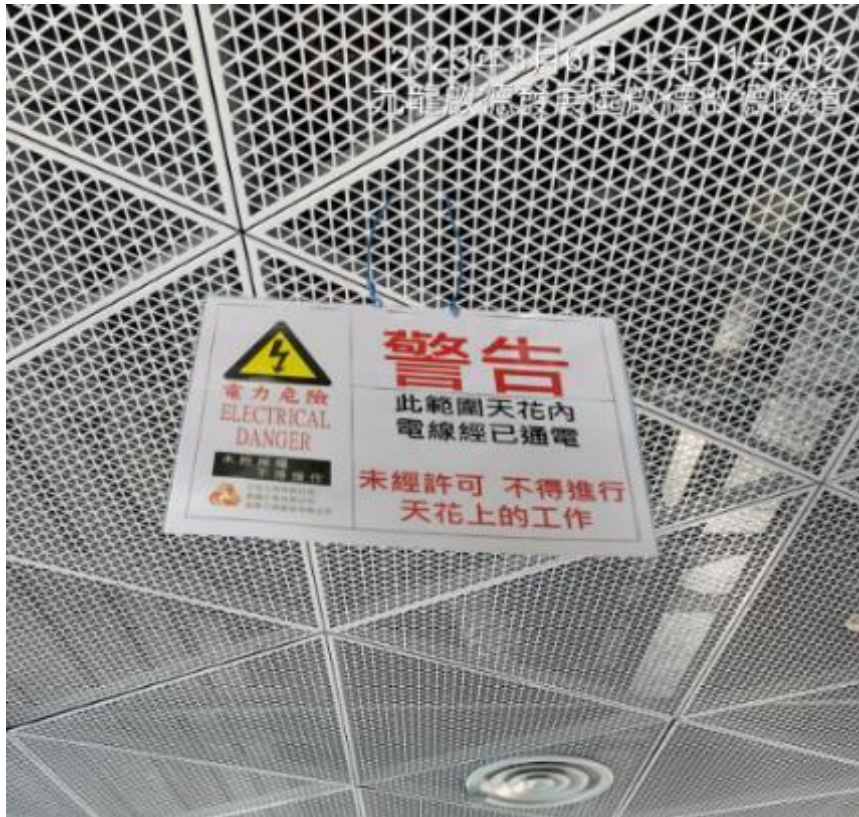

 <p>電力危險 ELECTRICAL DANGER</p> <p>未經許可 不得操作</p> <p>字號: 1110000001 香港工程師學會 註冊工程師協會</p>	<h1>警告</h1> <p>此範圍天花內 電線經已通電</p> <p>未經許可 不得進行 天花上的工作</p>
--	--



# Warning Notice for the Ceiling Work Permit Suspension Power Area

## 標示圍封區域

- 1) 停電位置圖 (power zone map)
- 2) 天花工作許可證 (PTW)
- 3) 停電告示 (PTW area notice)



工作許可證(通電後「天花」工作)  
Permit to Work (Ceiling Works after energization)

許可證編號: MS/HSE/PSG/P06--C0041

行業	申請人性名	申請人簽名	Power Zone	Area	已檢查附件資料
電氣	Ken Tse		1, 2	L00	✓是
空調	Michael Lo	<i>Michael Lo</i>	1, 2	L00	✓是
水喉	嚴勁輝		1, 2	L00	✓是
消防	袁錦文	<i>袁錦文</i>	1, 2	L00	✓是
弱電	John Ho	<i>John Ho</i>	1, 2	L00	✓是
建築	劉偉雄		1, 2	L00	✓是

預算工作日期: 由 07-08-2023 至 14-08-2023 \*\*只適用於后頁指示位置

註: (1) 每天工作時段為09:00至18:00  
(2) 若工作時間超過18:00, 請與郵政署之部分申請

審批:

工地經理(Site PTW (Ceiling) C0041(20230807-0814)-L00-  
SIT NGOR FOO *[Signature]* 7 Aug 2023  
工地經理姓名及簽署 日期:

「發行人」批准上述「天花」工作安排:

ALICE CHOW *[Signature]* 7 Aug 2023  
「發行人」姓名及簽署(電器) 日期:

YIP HOP CHAU *[Signature]* 7 Aug 2023  
「發行人」姓名及簽署(空調) 日期:

註: 統一停電時間為 8/8/2023 (由電氣「發行人」批准)

開工前檢查及確認觸電危害已消除

\*本人ALICE CHOW(姓名)(項目經理/工程師/監工)\*現確認上述Power Zone已完成停電程序、天花測試及確認天花無帶電, A1擊或有關總掣已關閉及已執行上鎖掛牌的程序, 已去除觸電的危險, 工作範圍安全。 簽署: *[Signature]* (日期: 8 Aug 2023)

工地經理確認: SIT NGOR FOO(姓名) 簽署: *[Signature]* (日期: 8 Aug 2023)

\*合資格的電業工程人員



## Warning Notice for the Ceiling Work Permit Suspension Power Area



AED原廠編號	擺放位置	AED原廠編號	擺放位置
SN:A20B - 02059	(北)護士櫃	SN:A19C - 3050	(南)護士櫃
SN:A19C - 02797	BLK C reception	SN:A19D - 10633	南1
SN:19I - 02697	北 1	SN:A19C - 02785	南2
SN:A19D - 10630	北 2	SN:19C - 02798	南3
SN:A19C - 02786	北 3	SN:19C - 02799	南4
SN:A19C - 03046	北 4	SN:A19C - 02613	南5
SN:19I - 002695	北 5	SN:A19D - 10629	南6
SN:A19D - 10631	北 6		

- ▶ 自動體外心臟電擊去顫器
- ▶ \*自動體外心臟去顫器，於傷者脈搏停止時使用。
- ▶ \* AED機設於協興地盤急救站及部分休息室。
- ▶ 使用方法
- ▶ 跟從AED 機指示：
  - ▶ A) 「開」機
  - ▶ B) 「貼上」電極片
  - ▶ C) 電擊

## Warning Notice for the Ceiling Work Permit Suspension Power Area

### 急救員名單會張貼於現場

	急救員姓名	聯絡電話
1	胡子游(Site nurse)	92316194
2	陳英傑(Site nurse)	54090618
3	劉偉雄	64341299
4	楊耀適	64181728
5	邱學煒	68420092
6	蒙偉傑	56110334
7	吳漢威	93411257
8	甘嘉林	67498292
9	霍錦漢	98161433
10	羅定邦	91751750

# 關閉電源後檢查

## 一、由項目經理 / 工程師 / 監工確認

- 1) 已完成相關power zone的停電程序；
- 2) 天花測試，天花無帶電；
- 3) AI掣或有關總掣已關；
- 4) 已執行上鎖掛牌程序。

## 二、工地經理確認



Majestic Engineering Co Ltd  
定安工程有限公司  
A Member of HSE Group



Young's Engineering Co Ltd  
景福工程有限公司  
A Member of HSE Group

表格號: EM-CWP-01

工作許可證(送電後「天花」工作)

Permit to Work (Ceiling Works after energization)

許可證編號: MS/HSE/PSG/P08- -C0041

第一部份: 申請於天花上施工(辦公時間內)(由「申請人」填寫)

行業	申請人姓名	申請人簽名	Power Zone	Area	已檢查附件資料
電氣	Ken Tse		1, 2	L00	✓是
空調	Michael Lo		1, 2	L00	✓是
水喉	嚴勁輝		1, 2	L00	✓是
消防	袁錦文		1, 2	L00	✓是
弱電	John Ho		1, 2	L00	✓是
建築	劉偉雄		1, 2	L00	✓是

預算工作日期: 由 07-08-2023 至 14-08-2023 \*\*只適用於后頁指示位置

註: (1) 每天工作時段為09:00至18:00  
(2) 若工作時間超過18:00, 請重新以第二部分申請

審批:

工地經理(Site PTW (Ceiling) C0041(20230807-0814)-L00-  
SIT NGOR FOO [Signature] 7 Aug 2023  
工地經理姓名及簽署 日期:

「發證人」批准上述「天花」工作安排:

ALICE CHOW [Signature] 7 Aug 2023  
「發證人」姓名及簽署(電器) 日期:

YIP HOP CHAU [Signature] 7 Aug 2023  
「發證人」姓名及簽署(空調) 日期:

註: 統一停電時間為 8/8/2023 (由電氣「發證人」統籌)

開工前檢查及確認無電危害已消除

\*由ALICE CHOW(姓名)(項目經理/工程師/監工)\*現確認上述Power Zone已完成停電程序, 天花測試及確認天花無帶電, AI掣或有關總掣已關閉及已執行上鎖掛牌的程序, 已去除觸電的危險, 工作範圍安全。 簽署: [Signature]  
(日期: 8 Aug 2023)

工地經理確認: SIT NGOR FOO (姓名) 簽署: [Signature] (日期: 8 Aug 2023)

\*合資格的電業工程人員

# 上載



# Novade

# 申請

Sample

Details | People (1) | Planning | Files (0) | Form Photos (2) | History

KT201901 - KTSP (SAFETY PHASE 2)  
天花工作許可證 0030-北區PSG-Ceiling 申請編號: 0030

[Collapse All Sections](#) | [Expand All Sections](#)

▼ 天花工作許可證

地點名稱:	KT201901 - KTSP (Safety Phase 2)
工作地點:	北區: 北區PSG-001--
項目: (*)=必填	
申請人姓名 (可輸入):	Chow Yan Yan 周燕燕
電話:	67112076
Company:	建安 / 聯運
工作位號(層數: Zone 1 / Zone 2):	L01 Zone 1
駐守警員 (需填A級警員):	[67] Lau Wai Hung Felix 劉偉洪
保安督察 (需填BS級督察):	PSG - Wong Lap Tung
Valid From:	30/06/2023 09:30
Valid Until:	10/07/2023 18:00

▼ 天花工作許可證紀錄

上傳天花工作許可證紀錄

Scan 29/6/2023 18:27:21

附加照片

IMG-20230629-09460388.jpg

# Pre - Work Briefing for Operator

- 1) Briefing
- 2) Safety Measures
- 3) PPE and Equipment Check







通知

# 延長許可證



Majestic Engineering Co Ltd  
定安工程有限公司  
A Member of Y&J Group



Young's Engineering Co Ltd  
眾福工程有限公司  
A Member of Y&J Group

表格編號: EM-CWT-01

工作許可證(送電後「天花」工作)

Permit to Work (Ceiling Works after energization)

許可證編號: MS/ISC/PSG/PWS

第二部份: 申請延長工作許可證/超時工作 (由「申請人」填寫)				
行業	申請人姓名	申請人簽名	停電Power Zone	已檢查附件資料
電氣				<input type="checkbox"/> 是
空調				<input type="checkbox"/> 是
水喉				<input type="checkbox"/> 是
消防				<input type="checkbox"/> 是
弱電				<input type="checkbox"/> 是
建築				<input type="checkbox"/> 是
預算延長工作日期: 由 _____ 至 _____ (工程於日間進行)				
預算超時工作日期: 由 _____ 至 _____ (由 _____ 時至 _____ 時)				
<p>審批:</p> <p>工地經理同意上述「天花」工作安排:</p> <p>_____ 日期: _____</p> <p>工地經理姓名及簽署</p> <p>「發證人」批准上述「天花」工作安排:</p> <p>_____ 日期: _____</p> <p>工地經理姓名及簽署 (電氣)</p> <p>_____ 日期: _____</p> <p>工地經理姓名及簽署 (空調)</p> <p>_____ 日期: _____</p> <p>_____ 日期: _____</p> <p>工地經理姓名及簽署 (弱電)</p> <p>_____ 日期: _____</p> <p>註: 統一停電時間為 _____ (由電氣「發證人」統籌), 但不適用於延長許可證申請。</p>				



YNG AC Engineer

延長許可證

工程部門與分判商商議天花  
高位施工




分判商

# 申請人填寫工作許可證第一部份 姓名,簽名,停電Power Zone 及檢查已附上附件檢查表



YNG AC Engineer



Area Site Manager



表格號: EM-CWP-01

工作許可證(送電後「天花」工作)  
Permit to Work (Ceiling Works after energization)

許可證編號: ~~MB/100/PSG/P09~~ -C0027

第二部份: 申請延長工作許可證/超時工作 (由「申請人」填寫)

行業	申請人姓名	申請人簽名	Power Zone	Area	已檢查附件資料
電氣	Ken Tse		1, 2	L00	<input checked="" type="checkbox"/> 是
空調	Michael Lo		1, 2	L00	<input checked="" type="checkbox"/> 是
水喉	嚴勁輝		1, 2	L00	<input checked="" type="checkbox"/> 是
消防	袁錦文		1, 2	L00	<input checked="" type="checkbox"/> 是
弱電	John Ho		1, 2	L00	<input checked="" type="checkbox"/> 是
建築	劉偉雄		1, 2	L00	<input checked="" type="checkbox"/> 是

預算延長工作日期: 由 **18-07-2023** 至 **24-07-2023** (工程於日間進行)  
預算超時工作日期: 由 \_\_\_\_\_ 至 \_\_\_\_\_ (由 \_\_\_\_\_ 時至 \_\_\_\_\_ 時)

審批: \*\*只適用於后頁指示位置

工地總理同意上述「天花」工作安排:

SIT NGOR FOO 18 July 2023  
 工地總理姓名及簽署 日期:

「發證人」批准上述「天花」工作安排:


ALICE CHOW 日期:  
 「發證人」姓名及簽署 (電器)

YIP HOP CHAU 18 July 2023  
 「發證人」姓名及簽署 (空調) 日期:

註: 統一停電時間為 \_\_\_\_\_ (由電氣「發證人」統籌), 但不適用於延長許可證申請。



**Area Site Manager**



**YNG AC Manager**

**MEC ELV Manager**

如有關施工位置,有行頭的電源會打出打入, 需要加簽批准延長工作許可證



**MEC EL Manager**

批准延長工作許可證



# Area Site Manager

把延長工作許可證交電氣發証人



Area Site Manager



MEC EL發証人

2. MEC EL發証人

# 撤銷許可證

工作許可證(送電後「天花」工作)  
Permit to Work (Ceiling Works after energization)

許可證編號: MS/ISC/PSG/POS

第三部份: 撤銷工作許可證(由「申請人」填寫)				
行業	申請人姓名	申請人簽名	工作已完成	完工時間
電氣			<input type="checkbox"/> 是	
空調			<input type="checkbox"/> 是	
水喉			<input type="checkbox"/> 是	
消防			<input type="checkbox"/> 是	
弱電			<input type="checkbox"/> 是	
建築			<input type="checkbox"/> 是	

工地經理確認本許可證內的所有「天花」工作已完成, 建議可從新送電:

\_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_  
工地經理姓名及簽署

「發證人」批准批准撤銷本許可證:

\_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_  
工地經理姓名及簽署 (電器)

安排從新送電日期: \_\_\_\_\_


註: 由電氣「發證人」統籌其他行業「發證人」, 安排在同一時段內從新送出電源。



YNG AC Engineer

### 撤銷許可證

1. 申請人填寫工作許可證第一部份  
姓名,簽名,填上工作已完成  
及完工時間



工作許可證(送電後「天花」工作)

Permit to Work (Ceiling Works after energization)

許可證編號：MS/ISC/PSG/POS

第三部份：撤銷工作許可證(由「申請人」填寫)

行業	申請人姓名	申請人簽名	工作已完成	完工時間
電氣			<input type="checkbox"/> 是	
空調			<input type="checkbox"/> 是	
水喉			<input type="checkbox"/> 是	
消防			<input type="checkbox"/> 是	
弱電			<input type="checkbox"/> 是	
建築			<input type="checkbox"/> 是	

工地經理確認本許可證內的所有「天花」工作已完成，建議可從新送電：

\_\_\_\_\_  
工地經理姓名及簽署

\_\_\_\_\_  
日期：

「發證人」批准批准撤銷本許可證：

\_\_\_\_\_  
工地經理姓名及簽署 ( 電器 )

\_\_\_\_\_  
日期：


安排從新送電日期：\_\_\_\_\_

註：由電氣「發證人」統籌其他行業「發證人」，安排在同一時段內從新送出電源。



**Area Site Manager**

**1. Area Site Manager**  
把工作許可證交電氣發証人



**MEC EL Manager**

**2. MEC EL發証人**  
安排檢查工作  
安排重新打電工作

申請開啟電源表格  
Request for Permanent Power Supply

KAI TAK  
SPORTS PARK  
啟德體育園

Request for Permanent Power Supply	
Project (工地名稱工程)	Kai Tak Sports Park
Subcontractor(分包商) :	_____
Reference No. (編號) :	_____
Date (日期) :	_____
Subject (項目) :	_____
<b>Part A</b> To be completed by sub-contractor	
To : Hip Hing	
From : _____ (Sub-contractor)	
I, _____, certify that I have inspected the fixed electrical installation and am satisfied that the fixed installation complies with the requirement of CLP / EMSD (Code of Practice) and is in safe working order. I request your company to arrange with the electrical sub-contractor to connect power supply to the installation detail as following.	
Location : _____	
Power Supply Required / Date / Time : _____	
Signature (Applicant Representative) : _____ Date : _____	
<b>Part B</b> To be completed by Hip Hing and EL Sub-contractor	
1st Checking - Documentary	
<input type="checkbox"/> WR1a / Exemption Letter <input type="checkbox"/> Location Plan <input type="checkbox"/> Insulation Test Report	
Signature : _____ Date: _____	
Hip Hing	
Signature : _____ Date: _____	
Majestic (EL)	
2nd Checking - Site Installation	
<input type="checkbox"/> Permanent / Temp door <input type="checkbox"/> Electrical schematic diagram <input type="checkbox"/> Permanent / Temp door lock <input type="checkbox"/> Emergency contact person information <input type="checkbox"/> Door / Riser curb <input type="checkbox"/> Padlock for main switch of major equipment panel <input type="checkbox"/> Warning plate / Signage <input type="checkbox"/> RCBO for FSI lighting circuit <input type="checkbox"/> No wall / slab openings <input type="checkbox"/> Others _____	
Signature : _____ Date: _____	
Hip Hing	
Signature : _____ Date: _____	
Majestic (EL)	
Put N/A in box whenever not applicable	
Final Approval	
Signature : _____ Date: _____	
Hip Hing - BS Manager	
Signature : _____ Date: _____	
Majestic (EL) - Project Manager	
Power On Date: _____	
Majestic (EL) Representative / Engineer: _____	
Remark : _____	



# 開啟電源前檢查

## 一、由項目經理 / 工程師 / 監工確認

- 1) 已完成天花測試；
- 2) 天花等電位接駁已完成；
- 3) 啟動電源工序。

## 二、工地經理確認

工作許可證(通電後「天花」工作)

Permit to Work (Ceiling Works after energization)

許可證編號: MS/ISC/ISG/POS

第三部份: 撤銷工作許可證(由「申請人」填寫)

行業	申請人姓名	申請人簽名	工作已完成	完工時間
電氣			<input type="checkbox"/> 是	
空調			<input type="checkbox"/> 是	
水喉			<input type="checkbox"/> 是	
消防			<input type="checkbox"/> 是	
弱電			<input type="checkbox"/> 是	
建築			<input type="checkbox"/> 是	

工地經理(Site Manager)確認本許可證內的所有「天花」工作已完成。建議可從新送電:

\_\_\_\_\_

工地經理姓名及簽署 日期: \_\_\_\_\_

「發行人」批准撤銷本許可證:

\_\_\_\_\_

「發行人」姓名及簽署(電務) 日期: \_\_\_\_\_

安排重新送電日期: \_\_\_\_\_

註: 由電表「發行人」視乎其他行業「發行人」, 安排在同一時段內從新送出電源。

開工前檢查及確認稱電危害已消除

\*本人 \_\_\_\_\_ (姓名) (項目經理/工程師/監工) 確認以上此 Permit Zone 已啟動電源開工程序, 並已完成天花測試及全屋天花等電位接駁已無誤。 <供電圍安全>


簽署: \_\_\_\_\_ (日期: \_\_\_\_\_)

工地經理確認: \_\_\_\_\_ (姓名) 簽署: \_\_\_\_\_ (日期: \_\_\_\_\_)

\*合資格的電業工程人員

# Work Flow of Ceiling Permit

## 天花工作申請流程

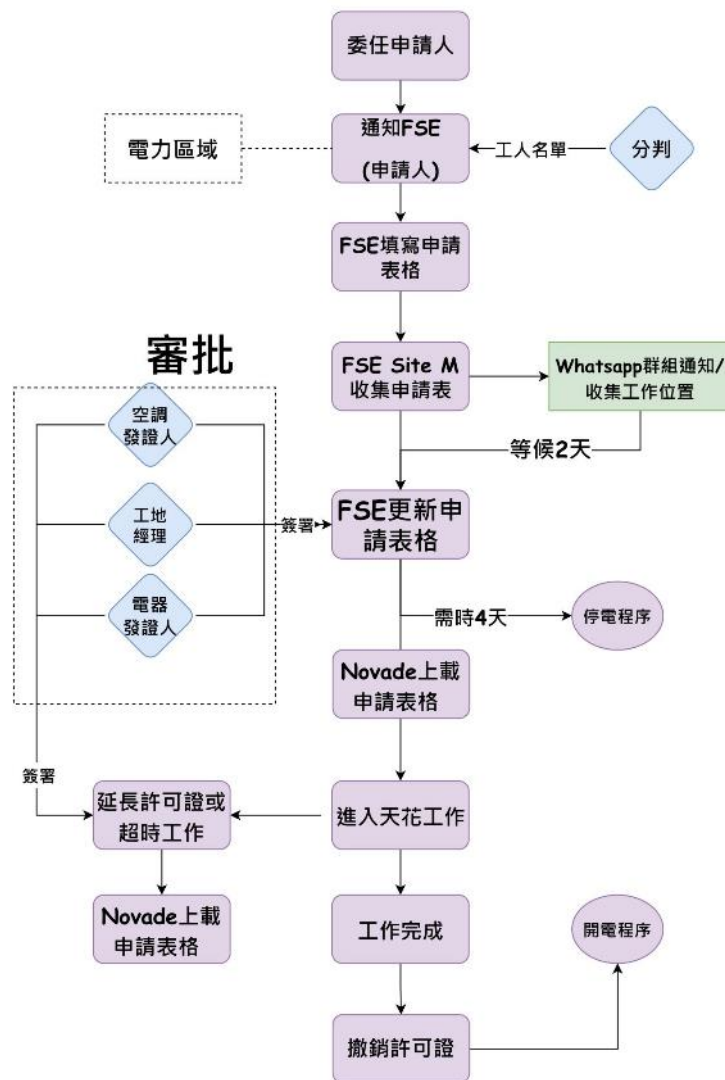

## Exemption of Permit for other ceiling works

For some other works working inside ceiling void the Permit will not be enforced; the works are divided into two categories, namely (a) critical situations and (b) short-term works

- a) For certain critical situations, like rescuing life or saving plant operations avoiding disasters where application of the Permit will exacerbate the situation.
- b) testing and commissioning under “LIVE” condition and routine inspections. (for Live work Electrical Safety Assessment Form assessed by REW)

# Require for Builder's Work

Scenario	Application for PTW	P.S.
E&M trade require to dismantle false ceiling	Apply by E&M	E&M apply SERVICE REQUEST to Main Contractor for dismantling false ceiling
Ceiling Work Subcontractors require to work over the ceiling grid which was energized	Apply by ceiling work subcontractor	



服務要求  
Service Request

[Filled by the Main Contractor (由總承建商填寫)] Ref. No (編號): \_\_\_\_\_

第一部份 - 要求 (由分判商填報) Part 1 - Request (to be completed by Sub-contractor)				
Project/Job No. (工地名稱 / 編號) : KTSP - MS				
Sub-contractor (分判商) : _____		Sub-Contract no.(分判合約編號) : _____		
Request Date (要求日期) : _____				
Subject (主題) : _____				
We request the following work(s)/service / material(s) to be carried out / supplied by the Main Contractor : (我司現要求貴司完成/提供下列工作/材料/服務/協助):				
A. Supply Material (供應物料)				
Item (項目)	Description (敘述)	Qty. (數量)	Delivery Date (運貨日期)	Other information (e.g. Specification) (其它資料, 例如規格)
B. Provision of work / service / attendance (完成工程/提供服務或協助)				
Item (項目)	Description (敘述)	Qty. (數量)	Location (位置)	Other information (其它資料)
Supporting document(s) (附屬文件): <input type="checkbox"/> Letter / document (函件) _____ <input type="checkbox"/> Drawing(圖則) _____				
We agree to reimburse you (the Main Contractor) the cost/expense in association with above request plus 7% admin charge (我司同意償還貴司(總承建商)因上述要求引至的費用及另加 7% 行政費。)				
Signed for and on behalf of the Sub-contractor (分判商代表簽署)		Name : _____ (姓名)	Date 日期 _____	
第二部份 - 回覆 (由總承建商填報) Part 2 - Reply (to be completed by the Main Contractor)				
In response to the request per Part 1, please take note of the following (關於第一部份之要求, 請留意下列回應)				
<input type="checkbox"/> Agreed, we shall proceed. (同意並進行)				
<input type="checkbox"/> Rejected. (拒絕)				
Signed by Project Manager (項目經理簽署)		_____ Name : _____ (姓名)	Date 日期 _____	

Note : After completion, original copy to site QS with copy to Site Agent, Internal Audit Section and Sub-contractor

Tick the box as appropriate

Effective on : 2 Dec 2013

IMS WP-SC/RFS - B





The voltage  
detectors 分判工友  
工作前，使用試電筆測試天  
花上的裝置有否通電



Use Voltage Detector to test the de-energized ceiling void

**For Safety Reason, please check the following area before start work at ceiling void.**

1) Test the hanger and cable tray before work

1) If test detector light up and hear a beep beep notification sound. Must stop work immediately and contact Electrical staff to follow.
